










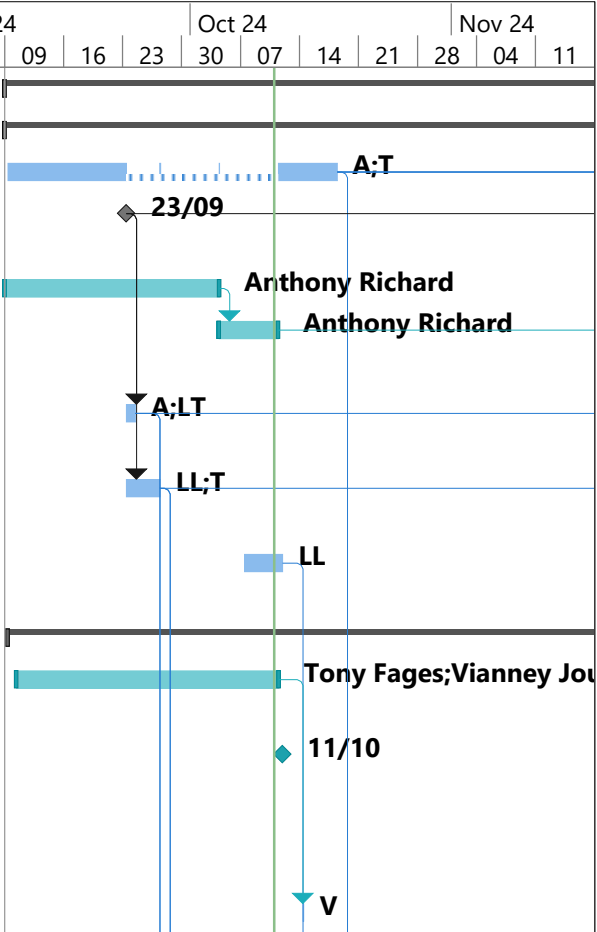


































N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Travail	Début	Fin	<div> <div>Sep 24</div> <div>26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11</div> <div>Oct 24</div> <div>Nov 24</div> </div>											
1			SAE	505,09 heures	Lun 09/09/24	Ven 27/06/25												
2			Cahier des charges	82 heures	Lun 09/09/24	Mar 20/05/25												
3			1.1 Créer des maquettes	25 heures	Lun 09/09/24	Ven 18/10/24												
4			1.2 Rédiger le Cahier des charges	25 heures	Lun 09/09/24	Lun 23/09/24												
5			1.3.1 Créer les Personas / US	3 heures	Lun 09/09/24	Ven 04/10/24												
6			1.3.2 Créer le Use Case	6 heures	Ven 04/10/24	Ven 11/10/24												
7			1.4 Prioriser le backlog	3 heures	Ven 16/05/25	Mar 20/05/25												
8			1.5.1 Faire des diagrammes de paquetage	7 heures	Lun 23/09/24	Mar 24/09/24												
9			1.5.2 Faire des diagrammes de classes	8 heures	Lun 23/09/24	Ven 27/09/24												
10			1.6 Faire WBS / estimation des tâches	5 heures	Lun 07/10/24	Ven 11/10/24												
11			Gestion de projet	32,09 heures	Lun 09/09/24	Mar 24/06/25												
12			2.1.1 Faire le GANTT prévisionnel	1,63 heures	Mar 10/09/24	Ven 11/10/24												
13			2.7.1 Rapport 1 Gestion	7,46 heures	Lun 09/09/24	Ven 11/10/24												
14			2.7.1 Rapport 2 Gestion	7 heures	Jeu 06/02/25	Ven 14/02/25												
15			2.7 Préparer la soutenance finale	10 heures	Mar 24/06/25	Mar 24/06/25												
16			2.1.2 Faire le GANTT réel	2 heures	Lun 14/10/24	Lun 14/10/24												



Projet : SAe_3A Date : Ven 11/10/24	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Travail	Début	Fin	Sep 24					Oct 24				Nov 24		
							26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11
17			2.4 Définir le planning des livrables	1 heure	Lun 14/10/24	Lun 14/10/24												
18			2.5 Affectation des tâches (KANBAN)	3 heures	Ven 04/10/24	Mar 07/01/25												
19			Application Mobile	148 heures	Ven 18/10/24	Ven 27/06/25												
20			4.2.3 Tests du code behind des views	15 heures	Lun 06/01/25	Lun 27/01/25												
21			3.1.4 Views de paramètres et profils utilisateur	29 heures	Mar 20/05/25	Ven 27/06/25												
22			3.1.3 Views de suivi de séance	34 heures	Lun 06/01/25	Ven 23/05/25												
23			3.1.2 Views de création/édition des entraînements	30 heures	Ven 18/10/24	Ven 16/05/25												
24			3.11 Views du questionnaire et de connexion	40 heures	Ven 18/10/24	Ven 27/06/25												
25			Base de donnée / API .NET	77 heures	Ven 27/09/24	Lun 09/06/25												
26			4.2.1 Tests unitaires .NET et Python	20 heures	Lun 02/06/25	Lun 09/06/25												
27			3.2.3 Mise en place et sécurisation des endpoints	12 heures	Lun 12/05/25	Ven 23/05/25												
28			3.2.2 Développement des services API	30 heures	Ven 24/01/25	Ven 14/02/25												

<div>Projet : SAe_3A</div> <div>Date : Ven 11/10/24</div>	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Travail	Début	Fin	<div> <div>Sep 24</div> <div>2602091623</div> <div>Oct 24</div> <div>3007142128</div> <div>Nov 24</div> <div>0411</div> </div>											
29			3.2.1 Entity Framework (création BDD)	15 heures	Ven 27/09/24	Lun 06/01/25												
30			IA	75 heures	Ven 27/09/24	Ven 27/06/25												
31			4.2.2 Tests et amélioration continue des résultats de l'IA	30 heures	Lun 12/05/25	Ven 27/06/25												
32			3.3.1 Formation sur le RAG et choix du LLM	30 heures	Mar 04/02/25	Ven 13/06/25												
33			3.3.2 Mise en place d'un LLM sur un serveur local	15 heures	Ven 27/09/24	Lun 07/10/24												
34			API Python	25 heures	Lun 06/01/25	Lun 27/01/25												
35			3.3.3 Développement de l'API Python	25 heures	Lun 06/01/25	Lun 27/01/25												
36			4.1 Configuration de l'environnement de production	15 heures	Ven 13/06/25	Jeu 26/06/25												
37			4.3 CI	20 heures	Lun 09/09/24	Lun 16/09/24												
38			4.4 CD	10 heures	Ven 11/10/24	Ven 18/10/24												
39			Documentation technique	12 heures	Lun 20/01/25	Mar 24/06/25												
40			5.1.1 Documentation API	5 heures	Lun 12/05/25	Mar 17/06/25												
41			5.1.2 Documentation architecture	7 heures	Lun 20/01/25	Mar 24/06/25												
42			Documentation Utilisateur	9 heures	Lun 09/09/24	Lun 16/09/24												

Projet : SAe_3A

Date : Ven 11/10/24

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes




















Échéance


Avancement

Progression manuelle

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Travail	Début	Fin	Sep 24					Oct 24				Nov 24		
							26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11
43			5.2 Documentation utilisateur	9 heures	Lun 09/09/24	Lun 16/09/24												




Projet : SAe_3A Date : Ven 11/10/24	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			

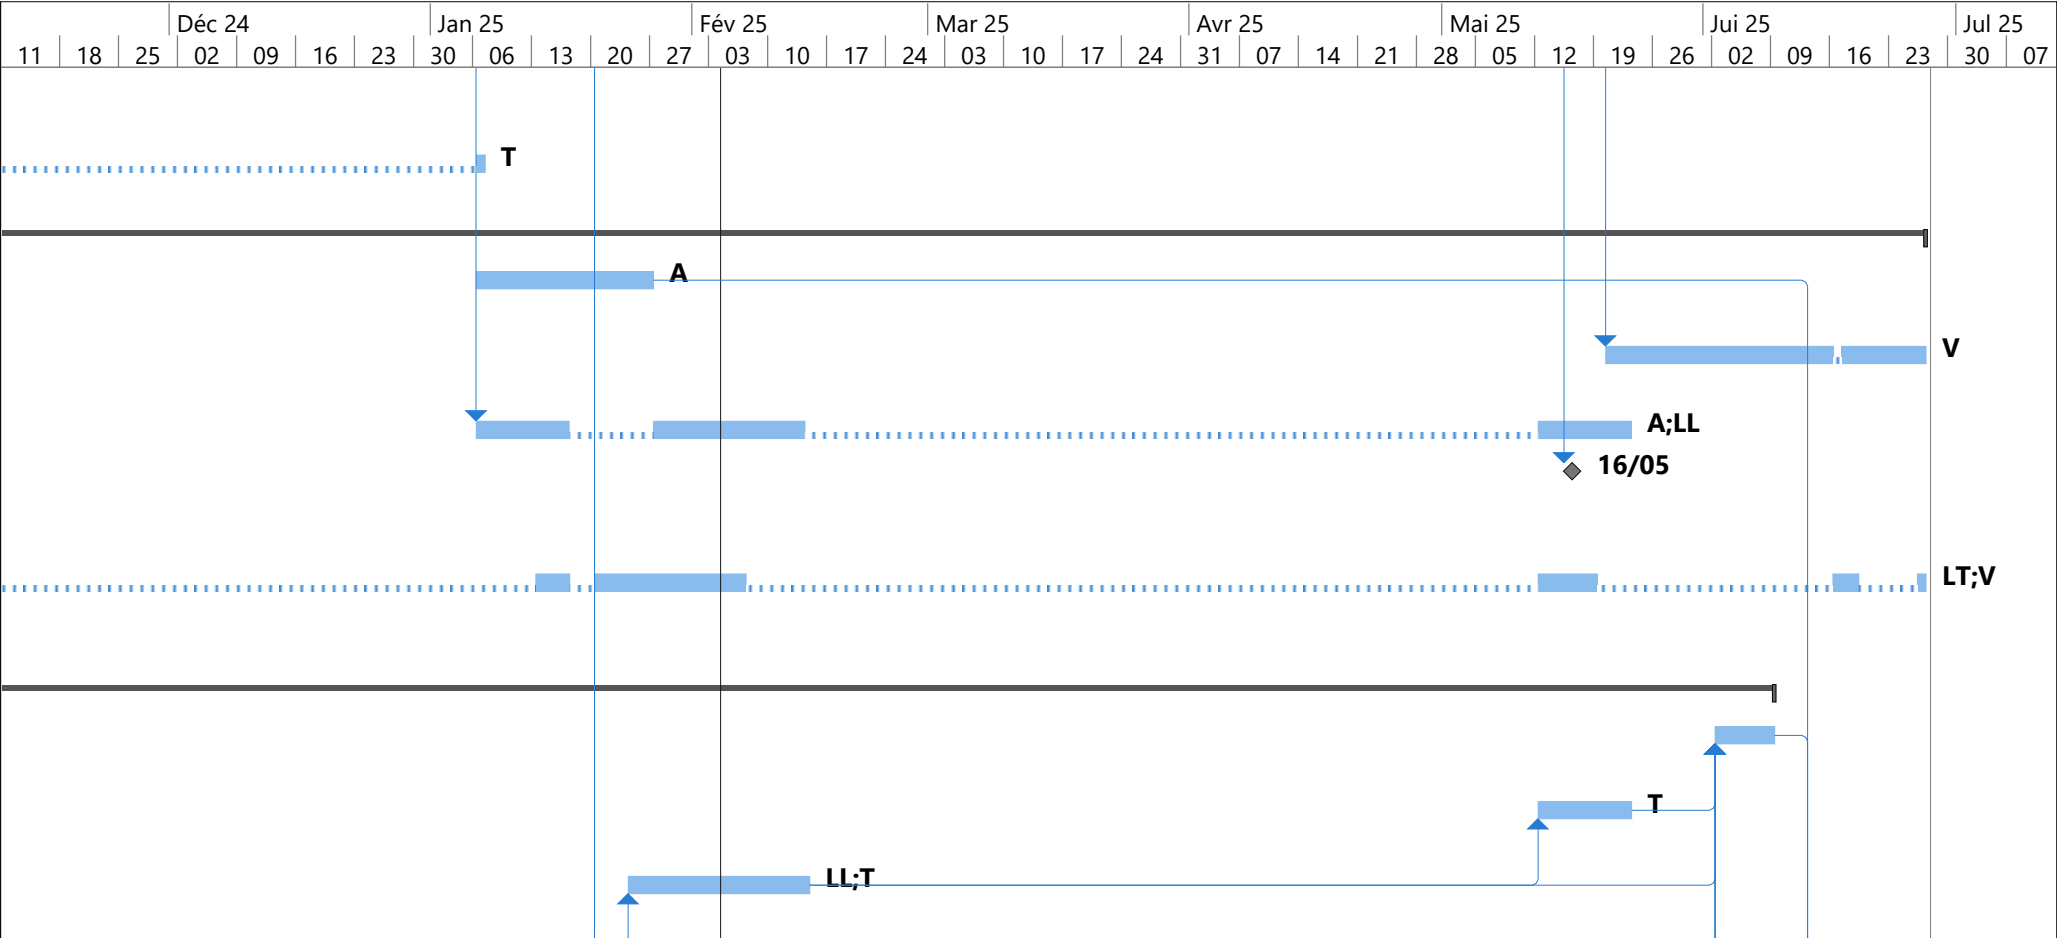

Projet : SAe_3A
Date : Ven 11/10/24

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

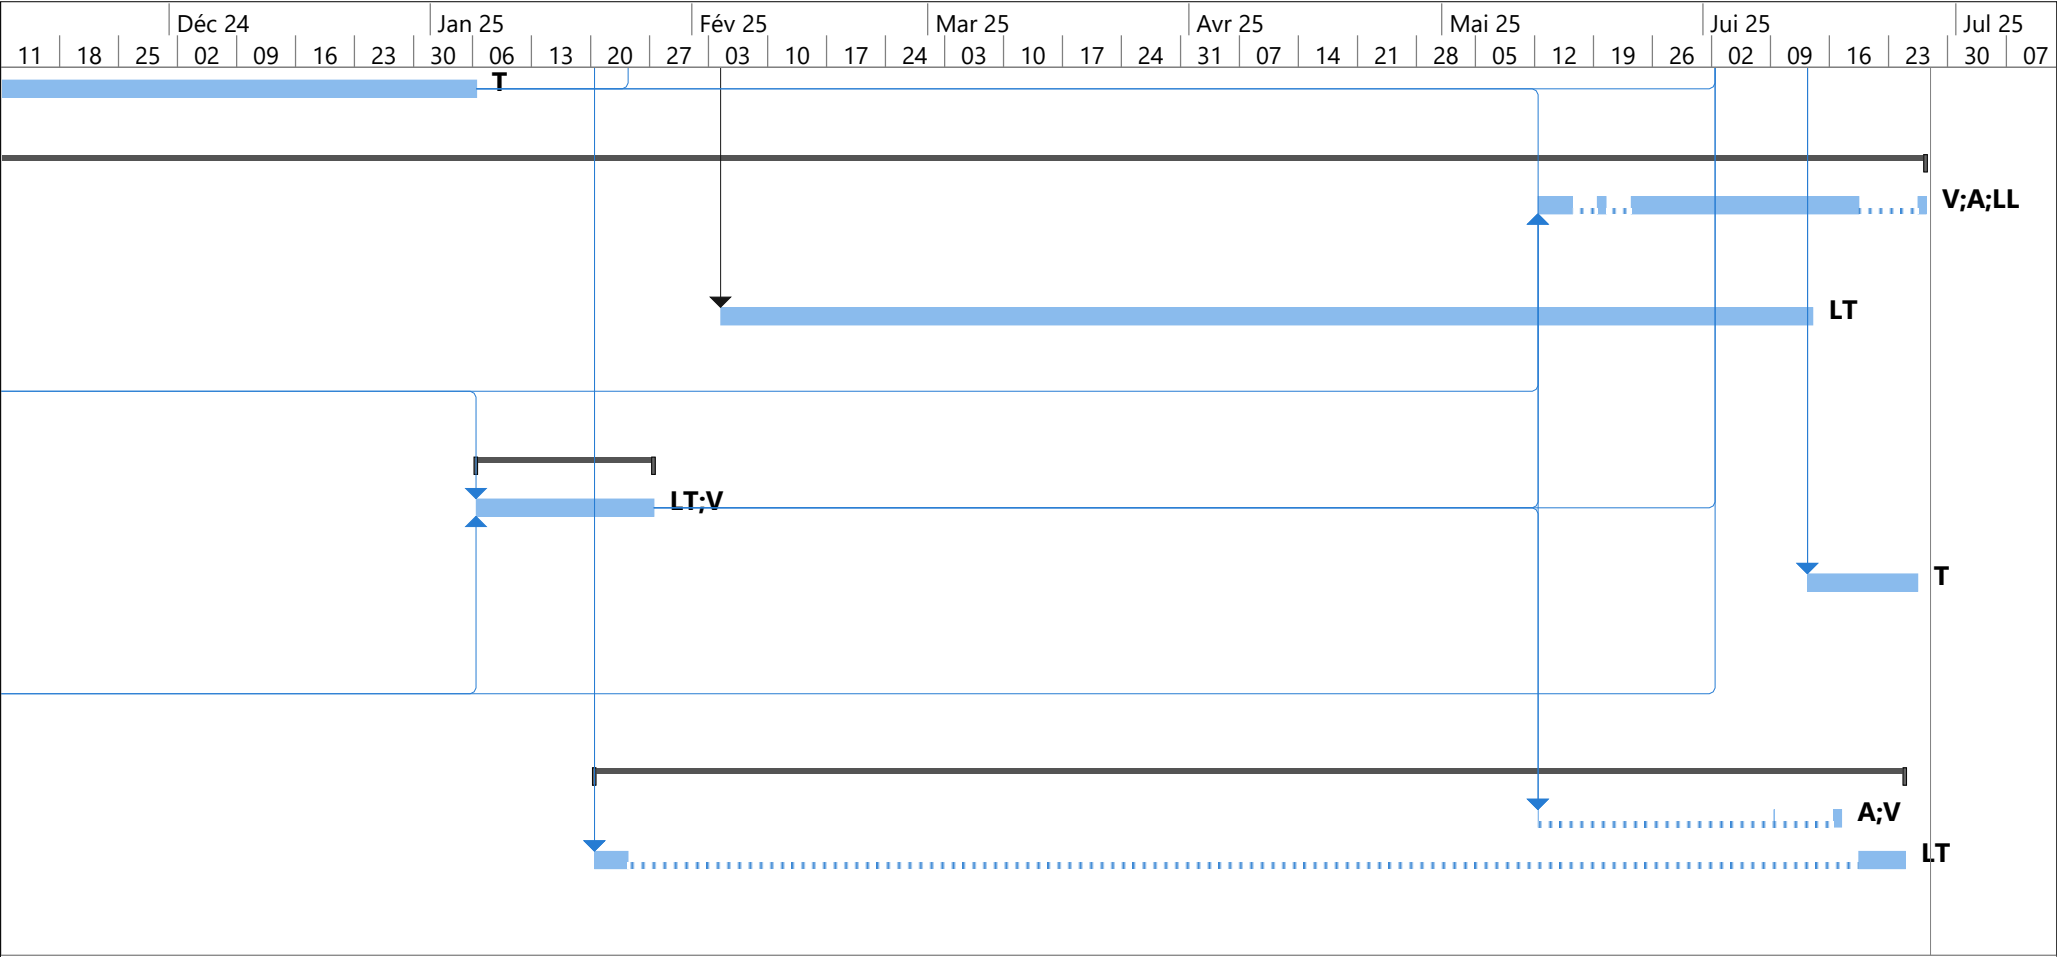




















Projet : SAE_3A
Date : Ven 11/10/24




















Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

[illegible]




















5

5

Projet : SAe_3A Date : Ven 11/10/24	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			

Projet : SAe_3A Date : Ven 11/10/24	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			

LL

Projet : SAe_3A Date : Ven 11/10/24	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			

Projet : SAe_3A
Date : Ven 11/10/24

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle

Page 12
